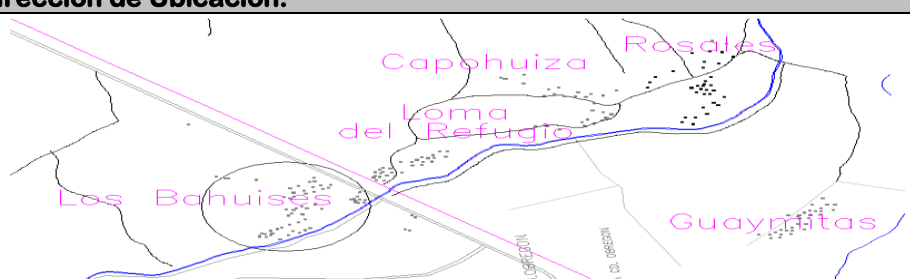


NOMBRE DE LA OBRA	CONTRATISTA	BENEFICIARIOS	ÁREA	PROGRAMA QUE FINANCIA	MONTO TOTAL DE INVERSIÓN
INSTALACION DE UNA SUBESTACION Y RAMAL SECUNDARIO EN BAHUISES	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	64	LINEA ENERGIA ELECTRICA	CECOP AYUNTAMIENTO COMUNIDAD	\$226,213.96

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN	DESCRIPCIÓN Y COMENTARIOS
<p><b>Dirección de Ubicación:</b></p> 	<p>INSTALACIÓN DE 11 POSTES Y TRANSFORMADOR DE 50 KVA EN RAMAL SECUNDARIO. INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO DE 12 MTS DE REMATE PARA LINEA 1F, 2H, 13 KV, INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO DE 9 MTS CON LINEA SECUNDARIA (3+1) 3/0 NEUTRANEL, INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE 50 KVA, UNICORNIO, 7621/240-120V EN POSTE DE CONCRETO DE 12 MTS CON RAMAL AEREO DE 1F, 2H, 13 KV, INCLUYE:CRUCETA PV-75, ABRAZADERA UL, ABRAZADERA 2AG, SOPORTE CV1, ASUS 13 KV, CLEMA ADS, BASTIDOR 1BR CON AISLAMIENTO, REMATE PREFORMADO 1/0, FLEJE GALV. CON HEBILLA, VARILLA COPPERWELD, CABLE 1/0 ACSR, APARTARRAYO 27 KV, BASTIDORES 3BR CON AISLADORES, CONECTOR PERICO, CABLE THW 1/0 AWG, CUCHILLA 38 KV Y CABLE (3+1) 3/0 NEUTRANEL.</p>

FOTOGRAFÍAS DE LA OBRA	
<p style="text-align: center;"><b>ANTES</b></p> <p style="text-align: center;">Fecha Fotografía: 18 ENERO 2016</p> 	<p style="text-align: center;"><b>DESPUÉS</b></p> <p style="text-align: center;">Fecha Fotografía: 09 FEBRERO 2016</p> 
