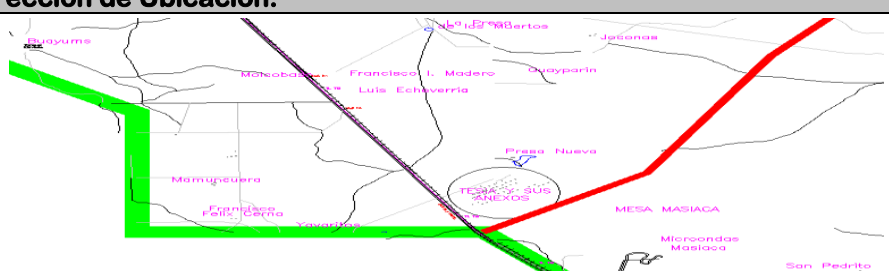


NOMBRE DE LA OBRA	CONTRATISTA	BENEFICIARIOS	ÁREA	PROGRAMA QUE FINANCIA	MONTO TOTAL DE INVERSIÓN
CONSTRUCCION DE TEJABAN METALICO DE 10.00 X 10.00 MTS CON CUBIERTA DE LAMINA EN E.P. JESUS GARCIA CORONA EN TESIA Y SUS ANEXOS	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	85	100 M2	CECOP AYUNTAMIENTO COMUNIDAD	\$143,347.89

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN	DESCRIPCIÓN Y COMENTARIOS
<p>Dirección de Ubicación:</p> 	<p>CONSTRUCCIÓN DE TEJABAN DE 10.00 X 10.00 MTS CON CUBIERTA DE LAMINA GALVANIZADA R-72 EN CAL. 26, CON POLIN DE 10 MT 12 EN COLUMNAS Y TRABES, POLIN 6 MT 14 PARA SOPORTE DE LAMINA. ZAPATAS DE 1.50 X 1.50 X 0.20 MTS ARMADA CON VARILLA DE 1/2" @ 15 CMS EN AMBOS SENTIDOS CONCRETO F'c= 250 KG/CM2 Y DADO DE 40 X 40 CMS ARMADO CON VARILLA DE 3/8" , COLOCACION DE PLACA METALICA PARA RECIBIR COLUMNA . PINTURA ESMALTE EN TODA LA ESTRUCTURA METALICA.</p>

FOTOGRAFÍAS DE LA OBRA	
<p>ANTES Fecha Fotografía: 18 ENERO 2016</p> 	<p>DESPUÉS Fecha Fotografía: 23 FEBRERO 2016</p> 
